


ANEXO OBRAS
LIFE IREKIBAI (LIFE14 NAT/ES/000186)
PERMEABILIZACIÓN DE LA REGATA TXARUTA
(T.M. DE DONAMARIA)

ACCIÓN C9: PERMEABILIZACION TXARUTA

Situación inicial-2016

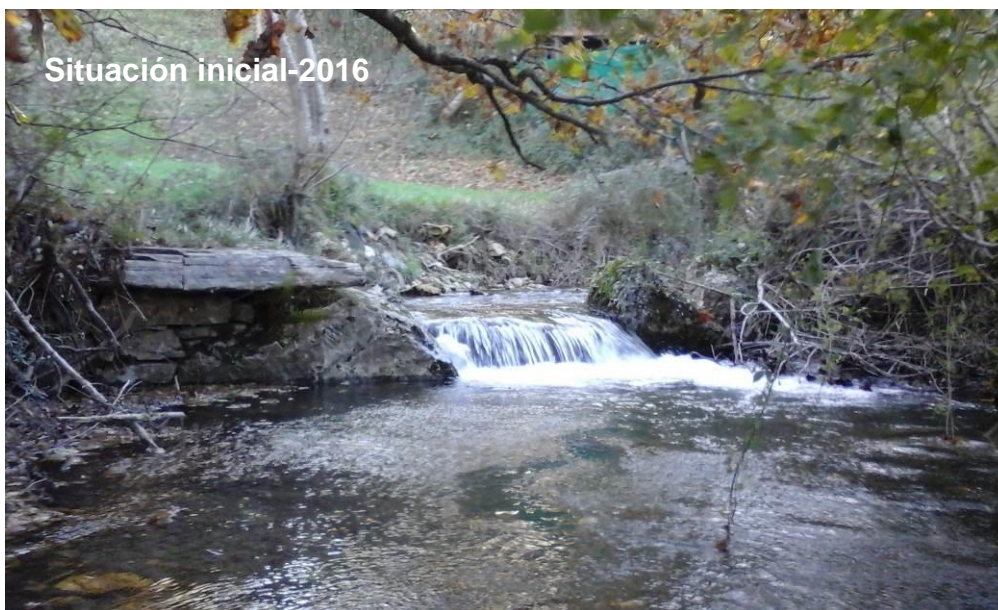

Situación final 2017



Noviembre 2017

PERMEABILIZACIÓN DE LA REGATA TXARUTA (T.M. DE DONAMARIA)

RESUMEN DE LOS TRABAJOS

ORDEN DE ACTUACIONES RELEVANTES

- 1.- Localización obra
- 2.- Estado previo de la actuación
- 3.- Permeabilización/demolición azud
- 4.- Estado final permeabilización/demolición azud

DATOS PRINCIPALES

- | | |
|--|----------------------|
| • Fecha comienzo trabajos | 22/Noviembre/2017 |
| • Periodo ejecución | 2 Días |
| • Fecha finalización trabajos | 24/Noviembre/2017 |
| • Presupuesto adjudicación (IVA no incluido) | 2.250,00 € |
| • Volumen demolición | 21,50 m ³ |

1.- Localización obra

La obra se localiza en la regata Txaruta, ubicándose la obra en el término municipal de Donamaria, siendo sus coordenadas UTM: 607.978, 4.773.367.




Localización actuación

2.- Estado previo de la actuación

La situación inicial, previo actuaciones en la presa de la regata Txaruta, presentaba la situación que a continuación se representa en las siguientes imágenes:



Imagen de la presa desde aguas abajo

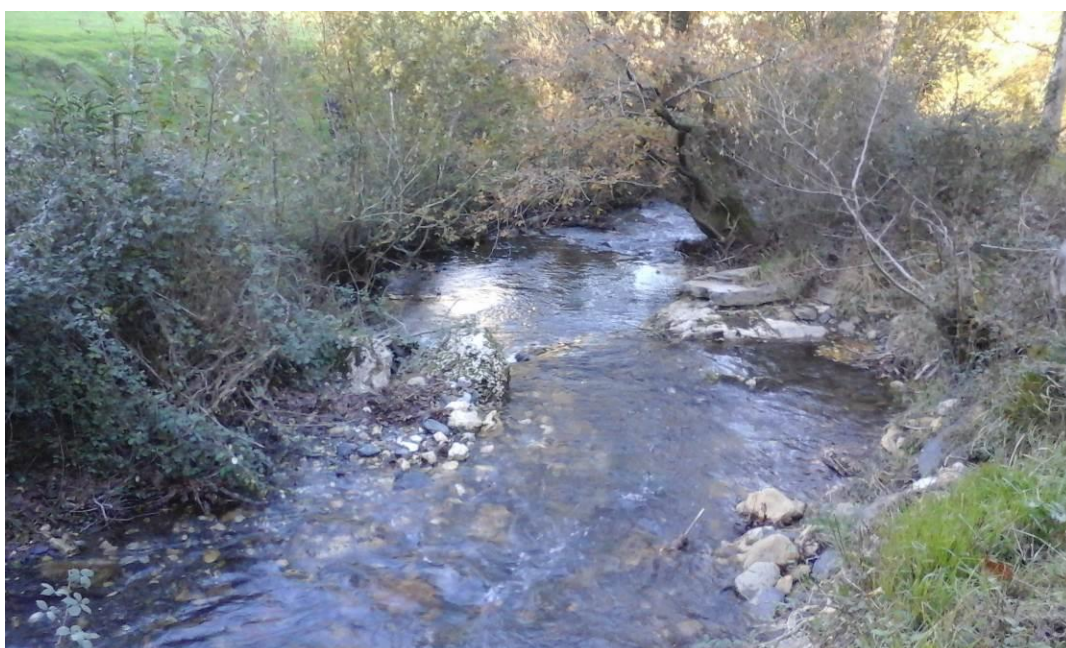

Aspecto presa desde aguas arriba

3.- Permeabilización/demolición azud

Una vez se valló la zona de actuación, se procedió a la demolición de la presa, según se representa a continuación:



Vallado zona actuación y acceso de la maquinaria al cauce



Proceso demolición presa

4.- Estado final permeabilización/demolición azud

Una vez terminada la demolición del azud, recuperando la morfología inicial de la regata Txaruta mediante el regularizado del material procedente de las obras y naturalizado el cauce, el aspecto de la zona de trabajo es:



Aspecto del cauce visto desde aguas arriba de la anterior ubicación de la presa



Aspecto de la regata vista desde aguas abajo de la antigua ubicación de la presa
